

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 塗装 改修工事

工事住所 北九州市 小倉北区 片野

工 期 着 手 令和 2 年 9 月 30 日

竣 工 令和 2 年 10 月 17 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



鍵交換



鍵交換



鍵交換



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



足場組立 完了



足場組立 完了



高圧洗浄

折板屋根



高圧洗浄

折板屋根




高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁

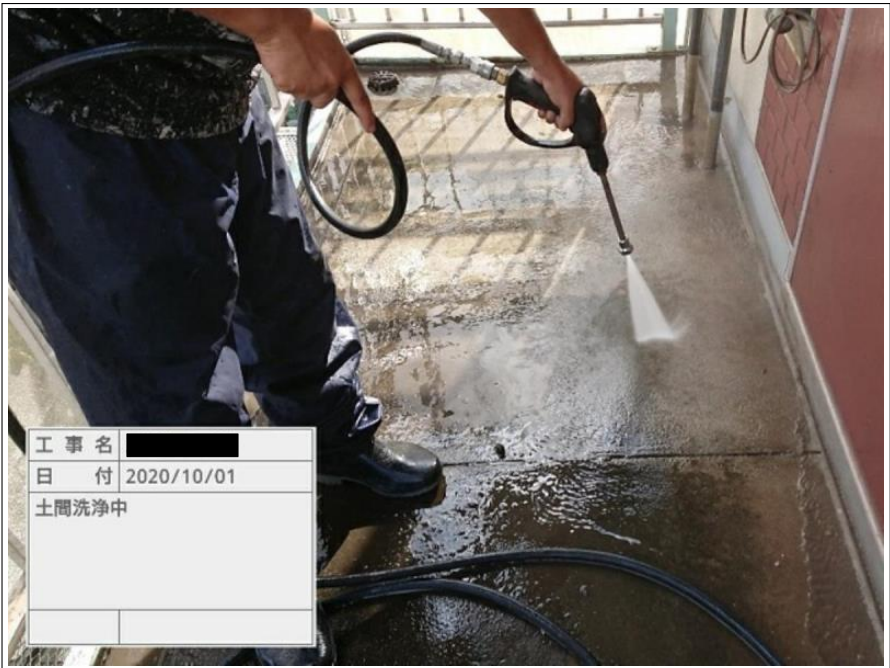

高圧洗浄

共用部廊下

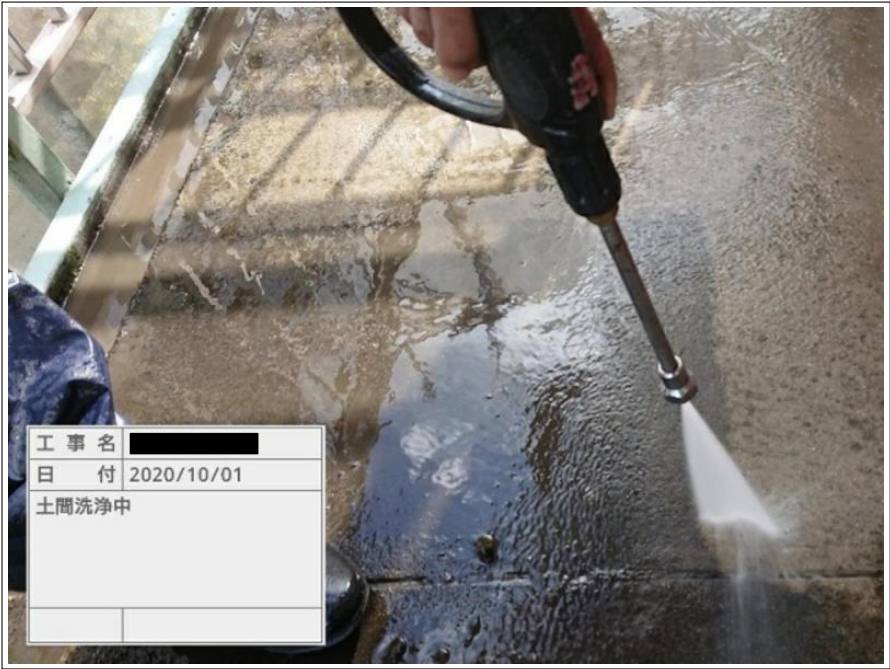

高圧洗浄

共用部廊下



高圧洗浄

鉄骨階段




高圧洗浄

鉄骨階段上裏



高圧洗浄

鉄骨階段土台

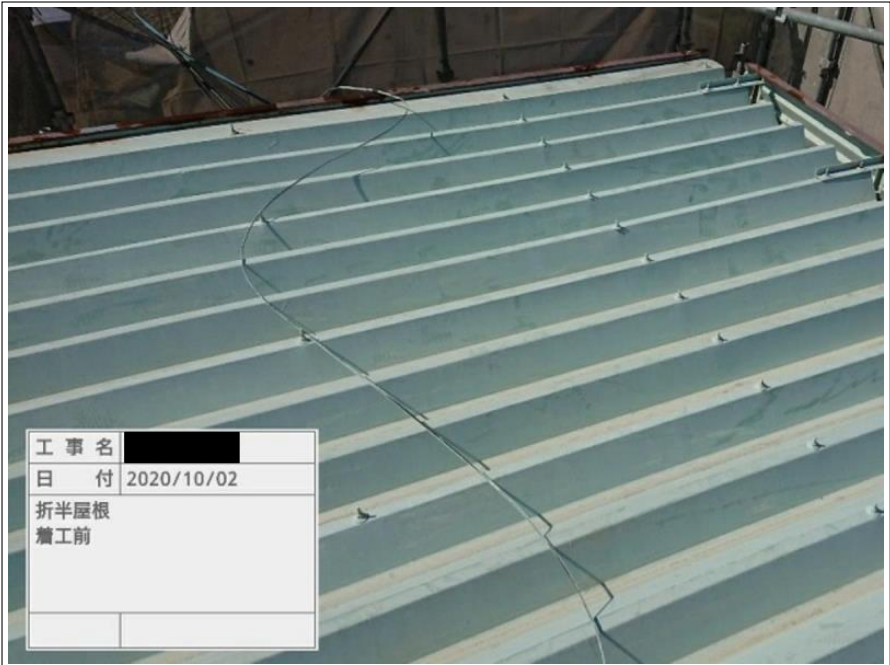

折板屋根

施工前



折板屋根

下地処理


ケレン中



折板屋根

下地処理

ケレン中

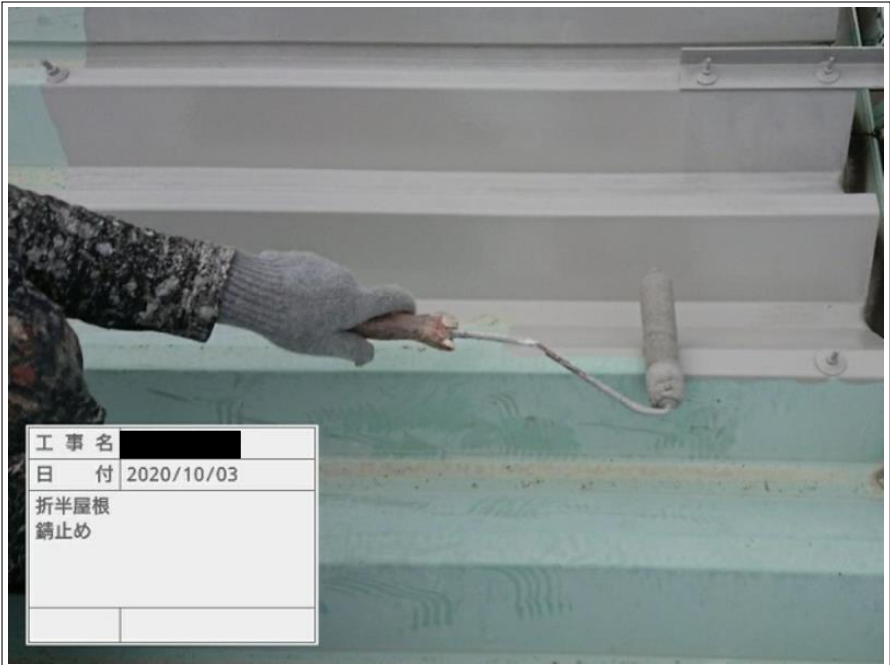

折板屋根

錆止め塗布



折板屋根

錆止め塗布

施工中



折板屋根

錆止め塗布

完了



折板屋根

錆止め塗布

完了



折板屋根

上塗り 1 回目



折板屋根

上塗り 1 回目

施工中



折板屋根

上塗り 1 回目

施工中



折板屋根

上塗り 1 回目

施工中



折板屋根

上塗り 1 回目

施工中



折板屋根


上塗り 1 回目

施工中



折板屋根

上塗り 2 回目

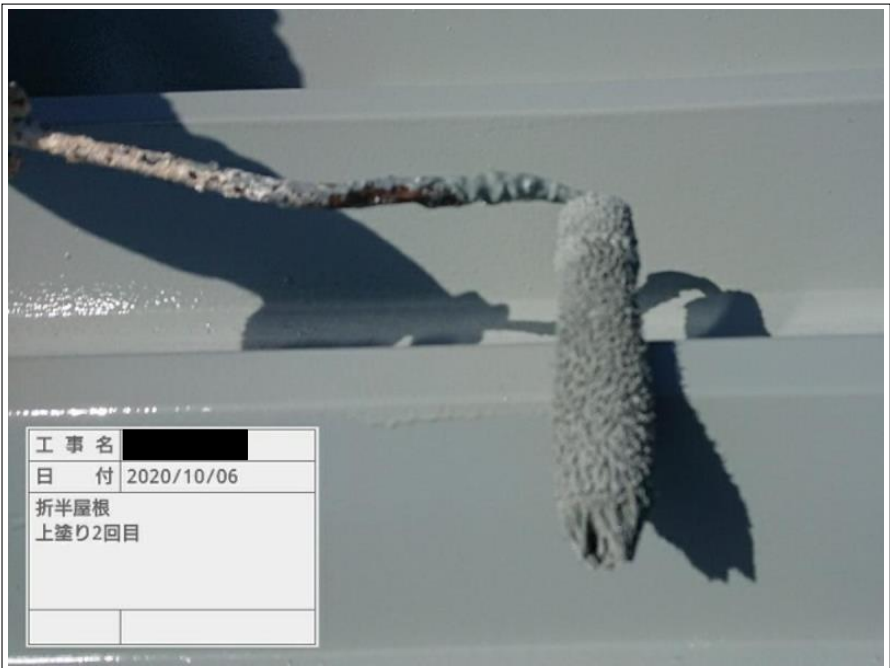

折板屋根

上塗り 2 回目

施工中



折板屋根

施工完了



折板屋根

施工完了




折板屋根

施工完了



折板屋根

施工完了

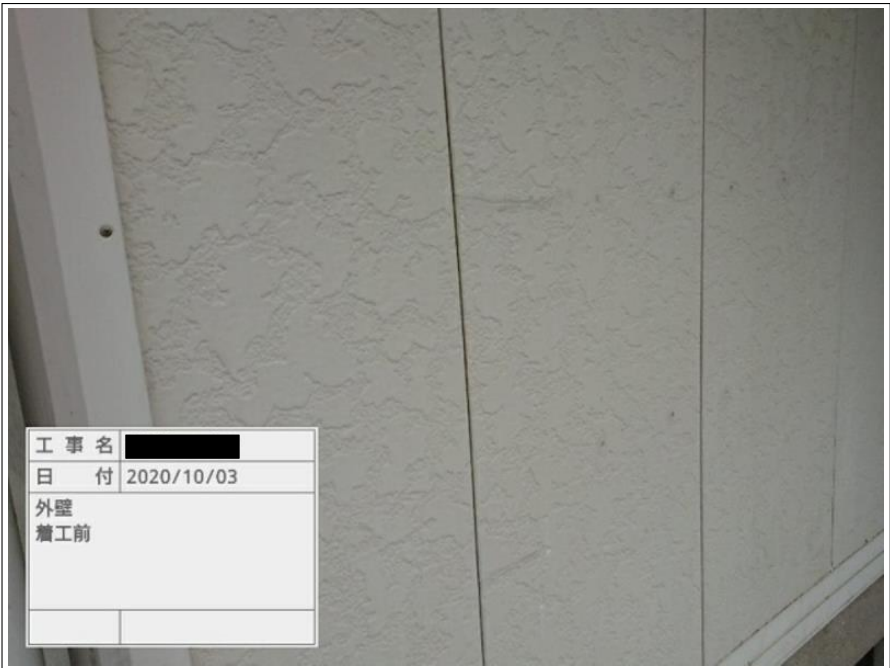

外壁

施工前



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し


プライマー塗布



シーリング打ち増し


プライマー塗布

施工中

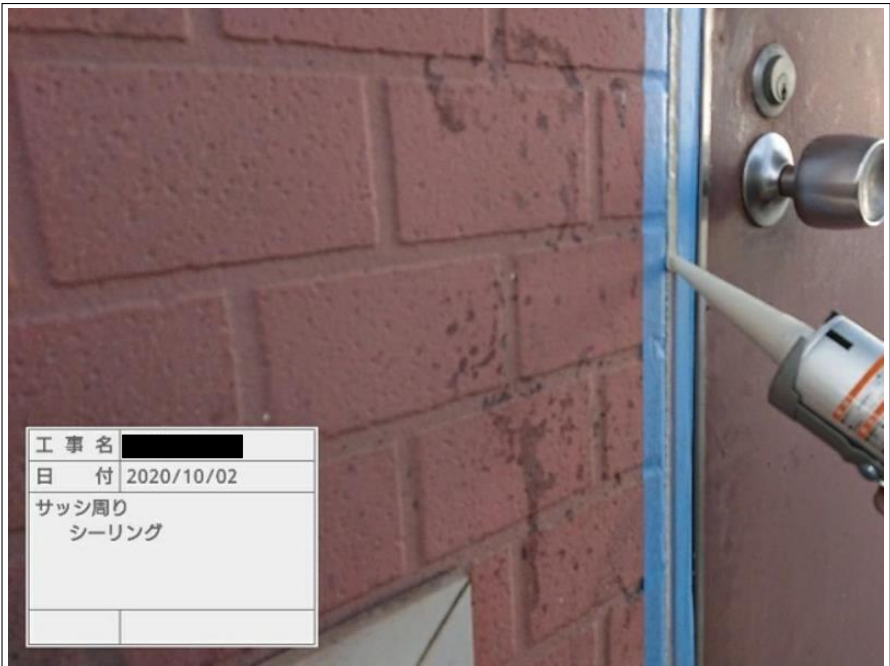

シーリング打ち増し


シーリング打ち

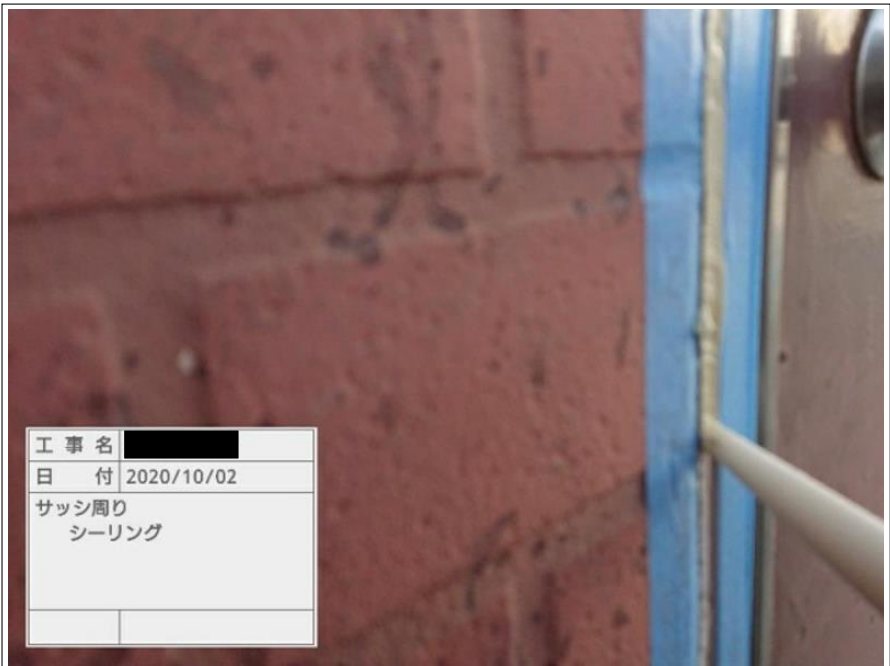

シーリング打ち増し

シーリング打ち


施工中

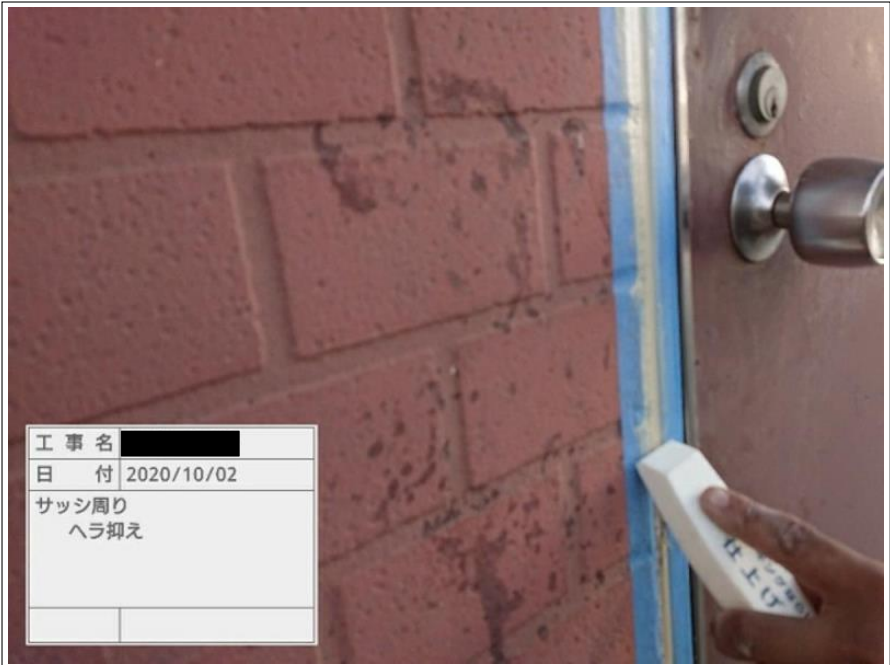

工 事 名	
日 付	2020/10/02
サッシ周り ヘラ抑え	

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

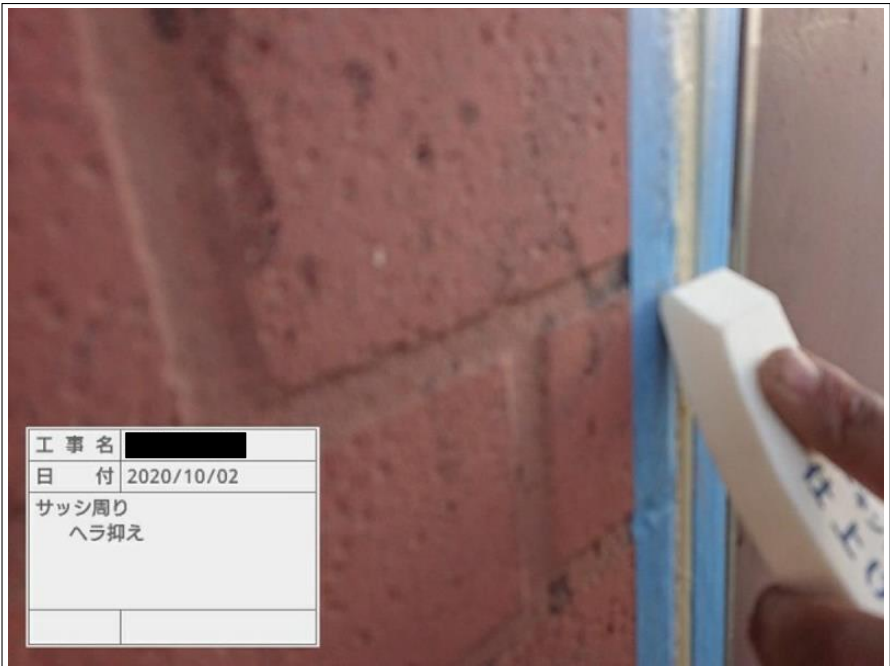


工 事 名	
日 付	2020/10/02
サッシ周り ヘラ抑え	

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中

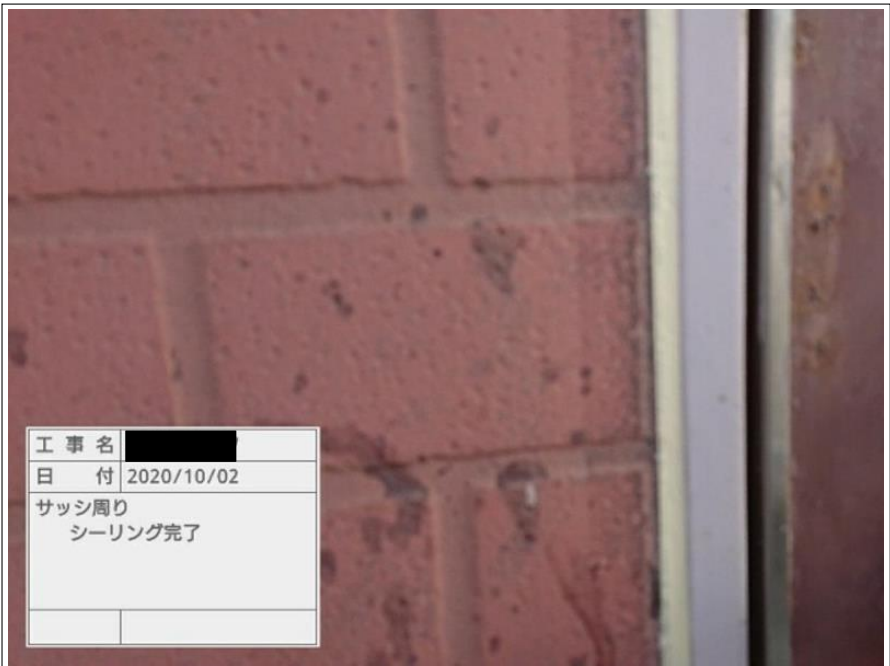

工 事 名	
日 付	2020/10/02
サッシ周り シーリング完了	

シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了

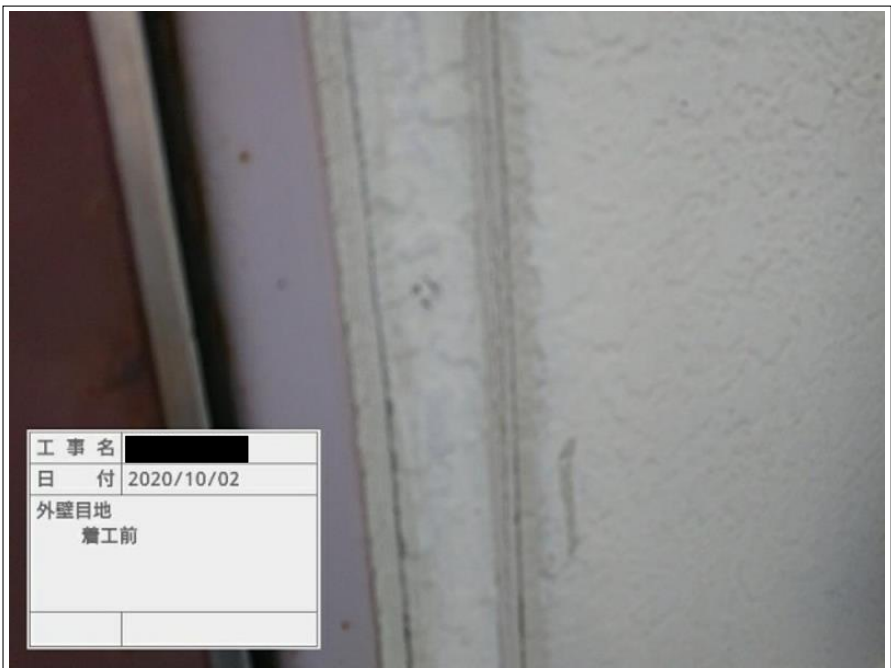

シーリング打ち替え

施工前

工 事 名	
日 付	2020/10/02
外壁目地	
着工前	



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布




工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
外壁目地	プライマー塗布

シーリング打ち替え

プライマー塗布


施工中

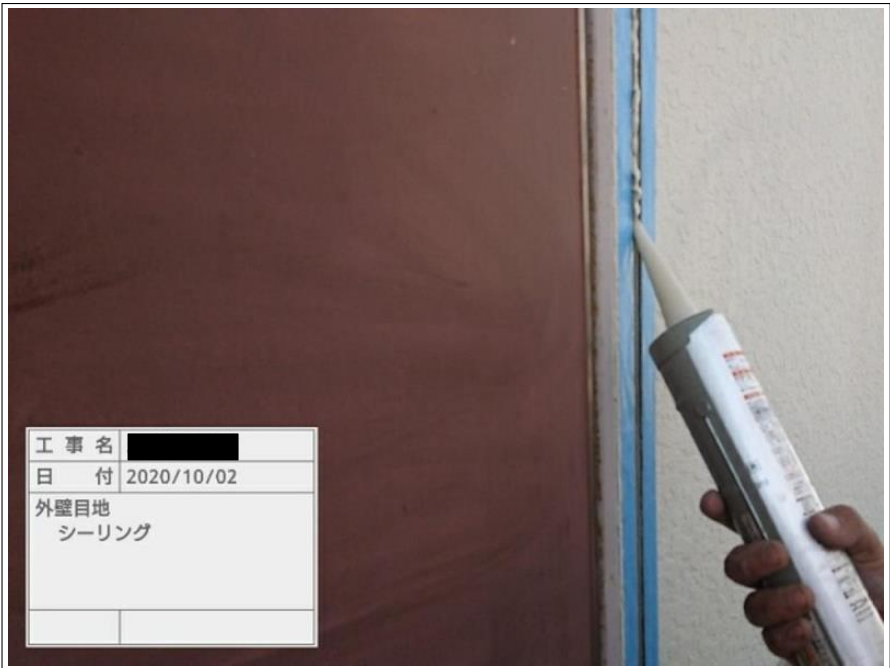

工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
外壁目地	シーリング

シーリング打ち替え

シーリング充填

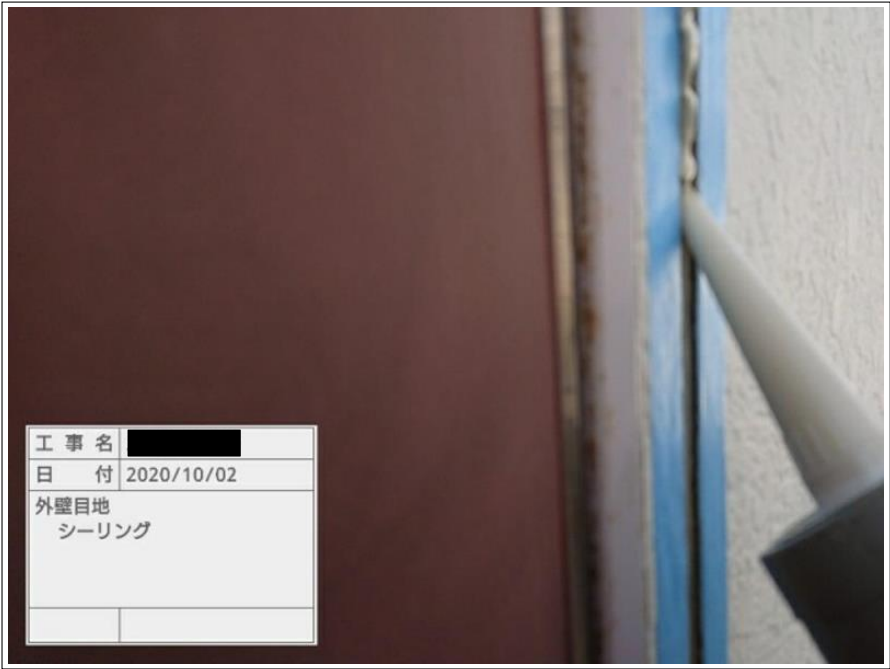

工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
外壁目地	シーリング

シーリング打ち替え


シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

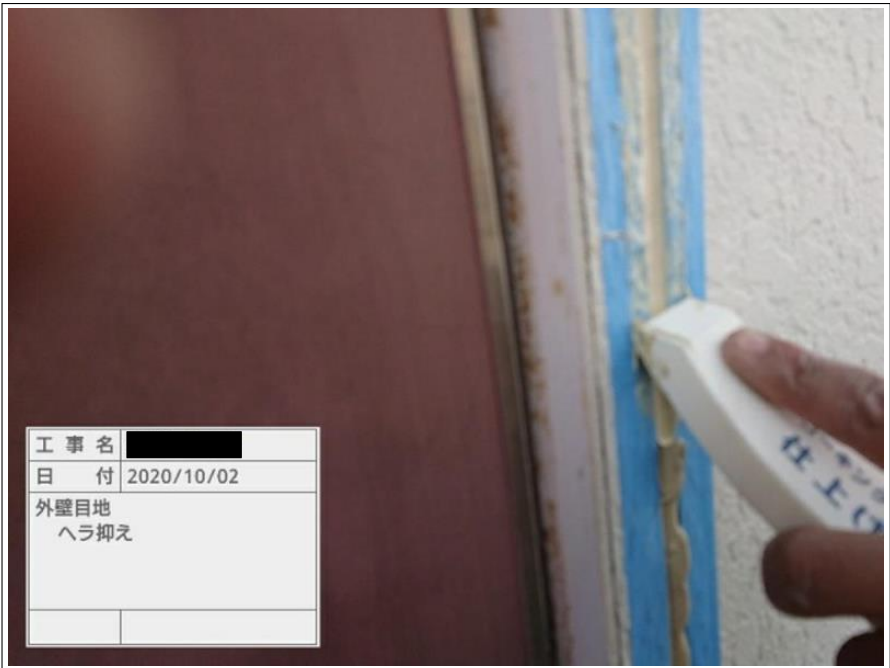

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ

施工中

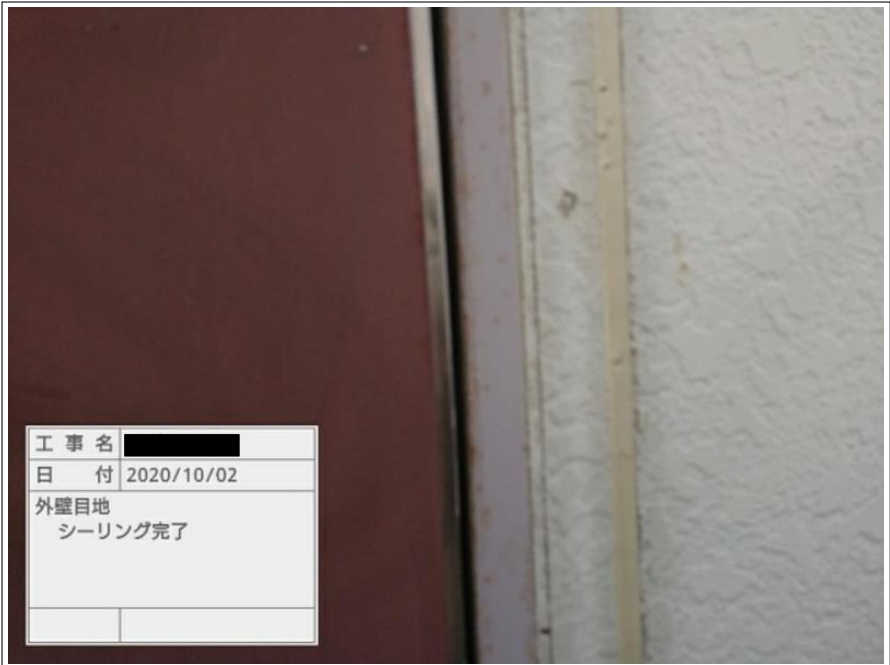

シーリング打ち替え

施工完了

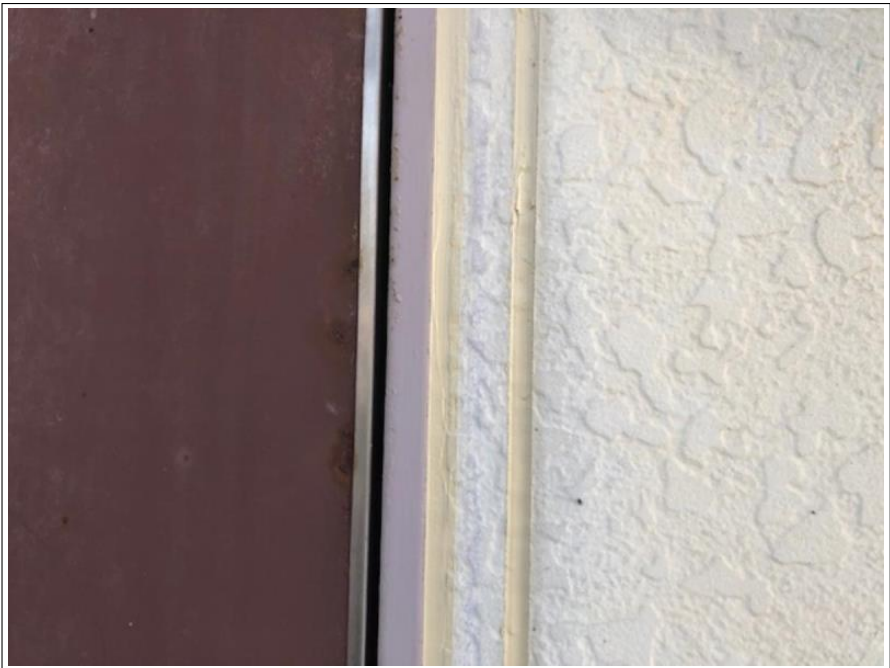

シーリング打ち替え

施工完了



外壁 メイン部

下塗り



外壁 メイン部

下塗り

施工中



外壁 メイン部

下塗り

施工中



外壁 アクセント部

下塗り

施工中



外壁 アクセント部

下塗り

施工中



外壁


下塗り

完了



外壁 メイン部

中塗り

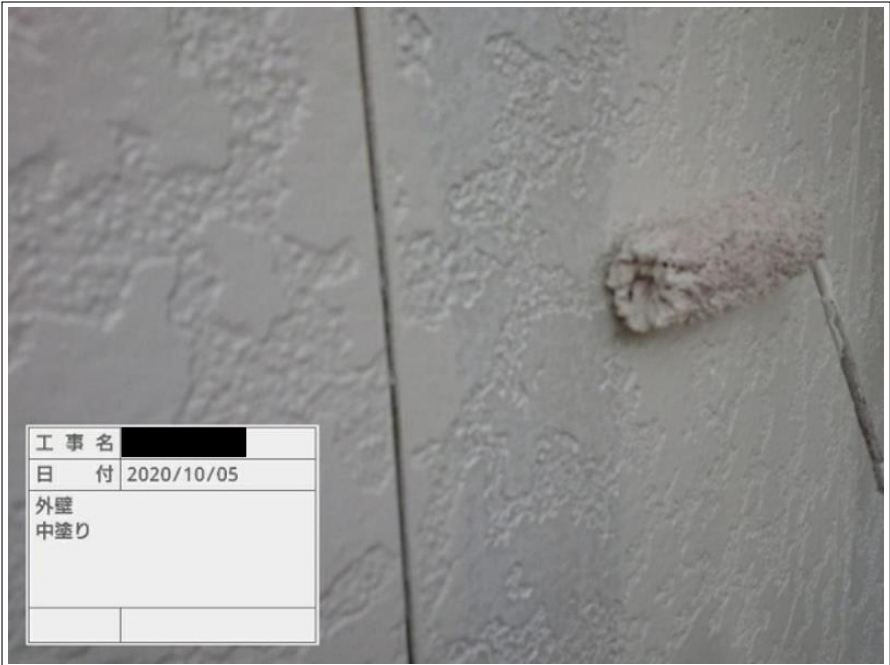

外壁 メイン部

中塗り


施工中



外壁 メイン部

中塗り

施工中

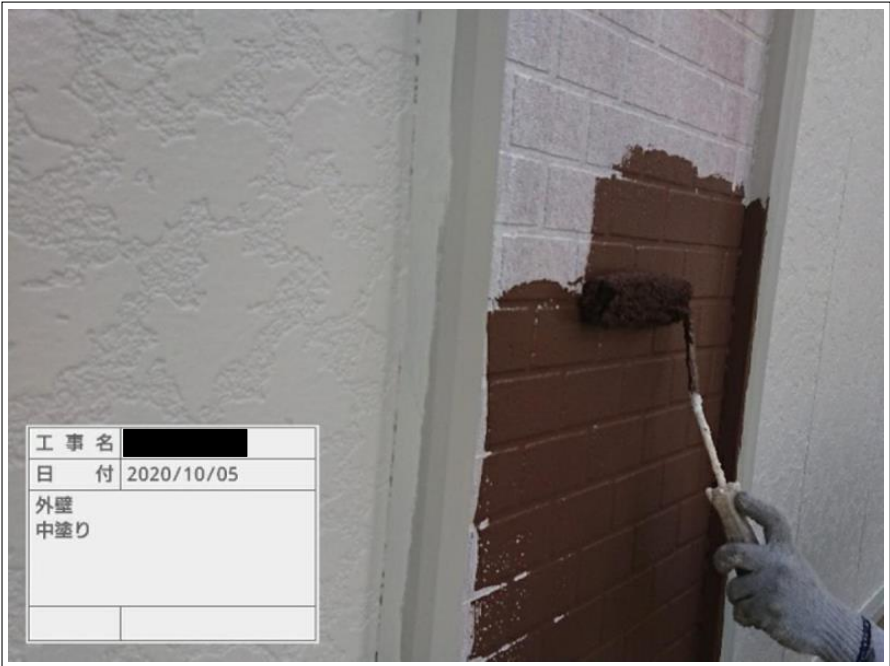

外壁 アクセント部

中塗り

施工中



外壁 アクセント部

中塗り


施工中



外壁

中塗り

完了

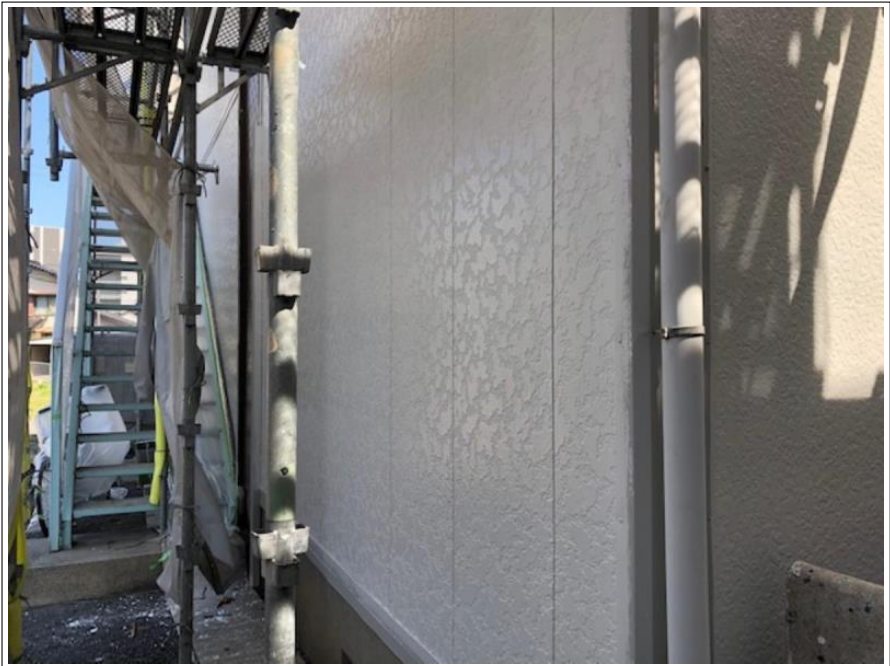

外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り


完了



外壁

中塗り


完了

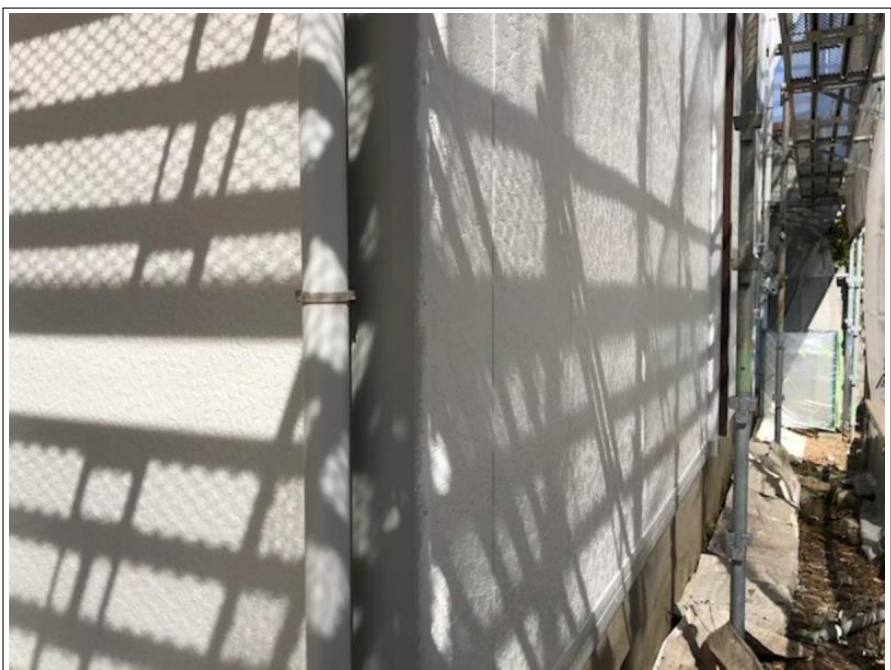

外壁

中塗り

完了

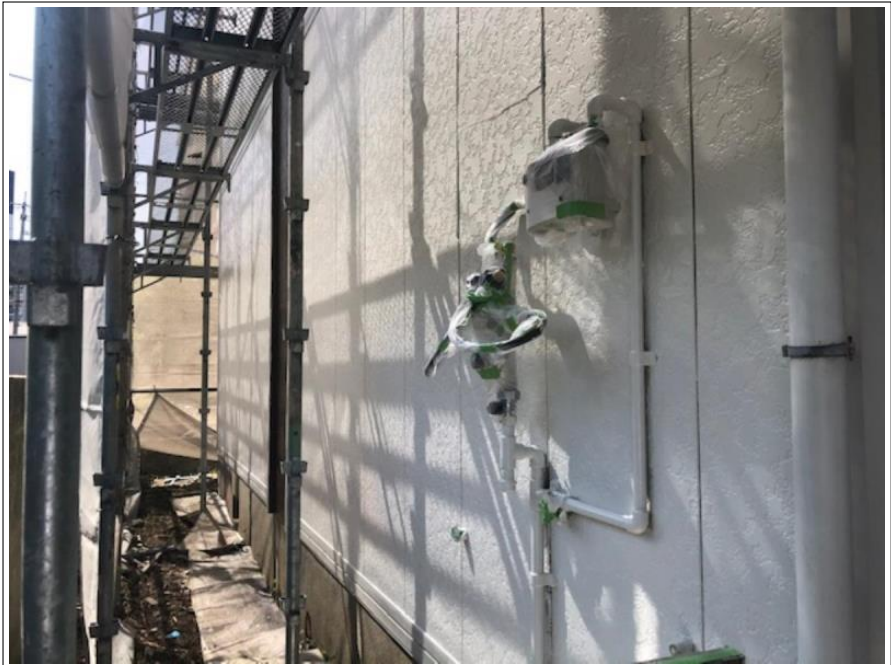

外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り

完了



外壁

中塗り


完了



外壁

中塗り

完了

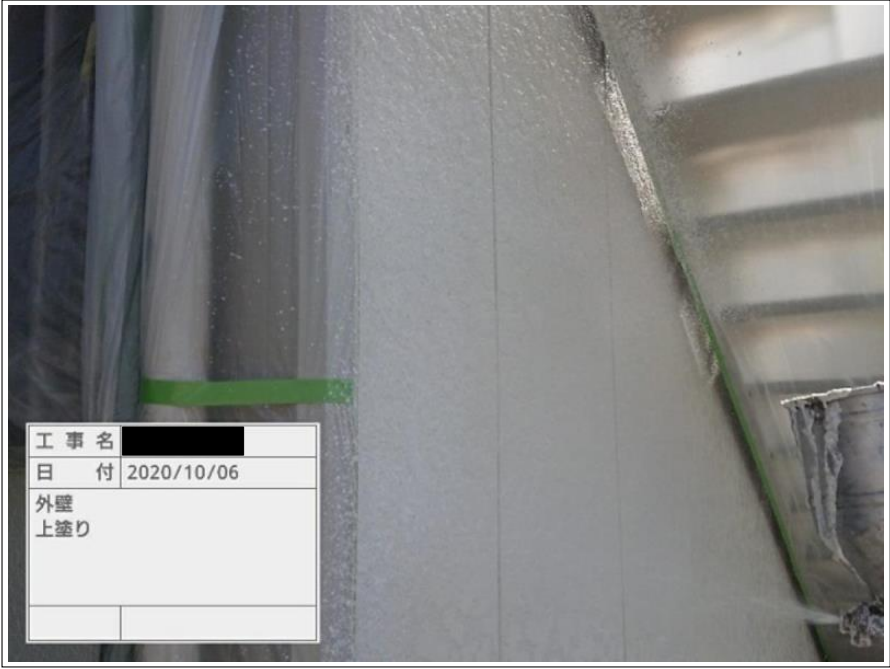

外壁 メイン部


上塗り



外壁 メイン部

上塗り

施工中

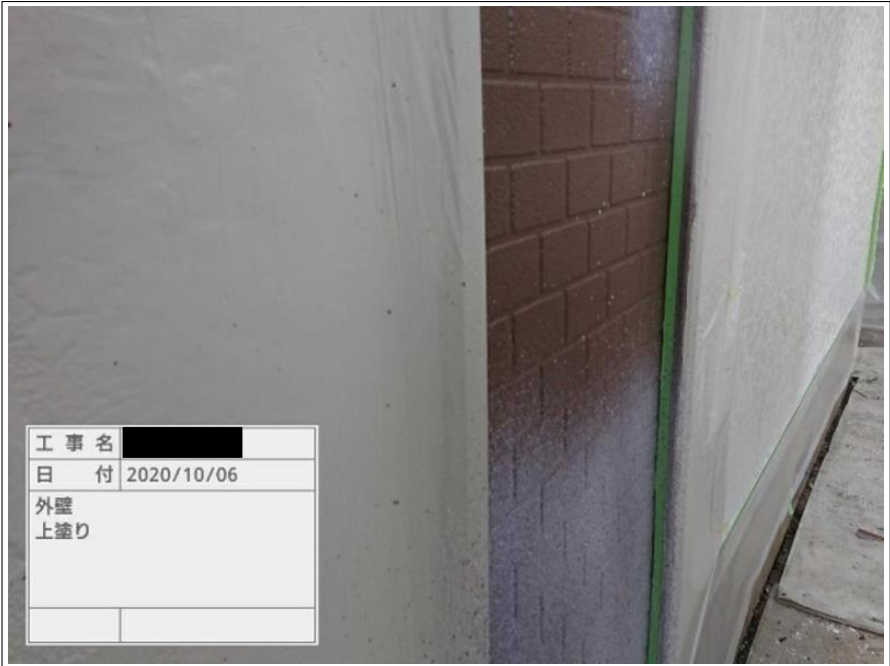

外壁 アクセント部

上塗り


施工中



外壁 アクセント部

上塗り

施工中

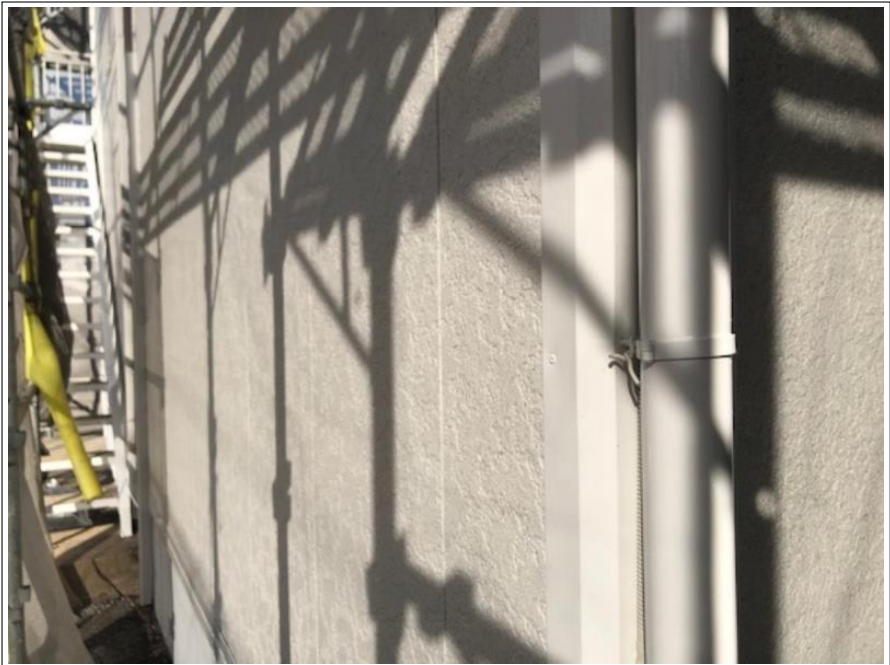


外壁

施工完了




外壁

施工完了

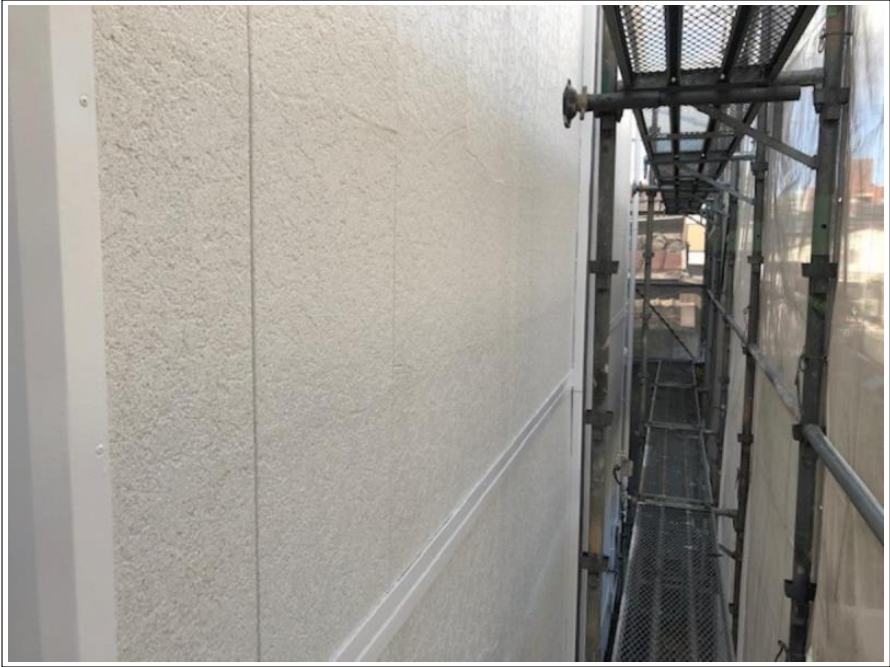

外壁

施工完了

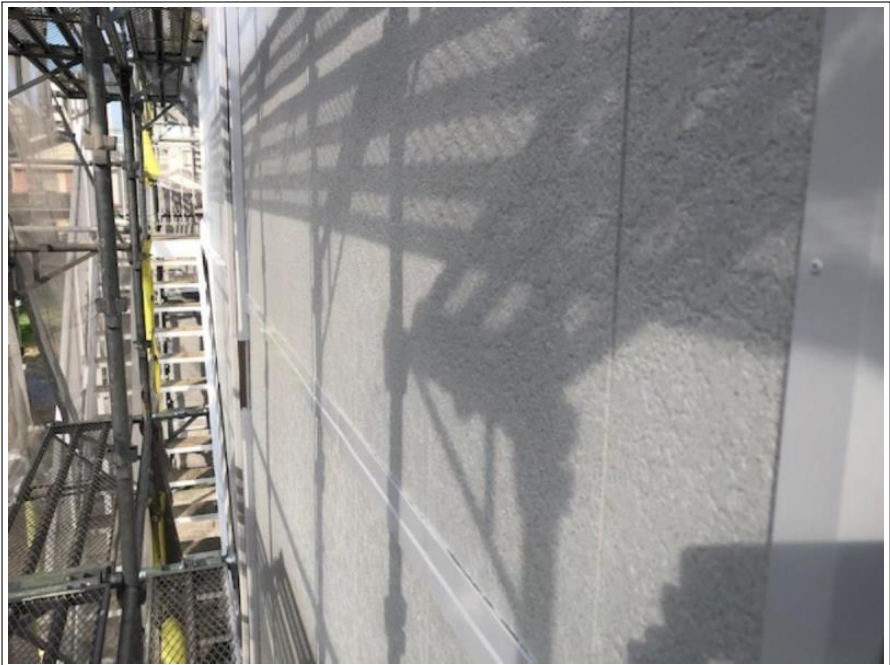

外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了

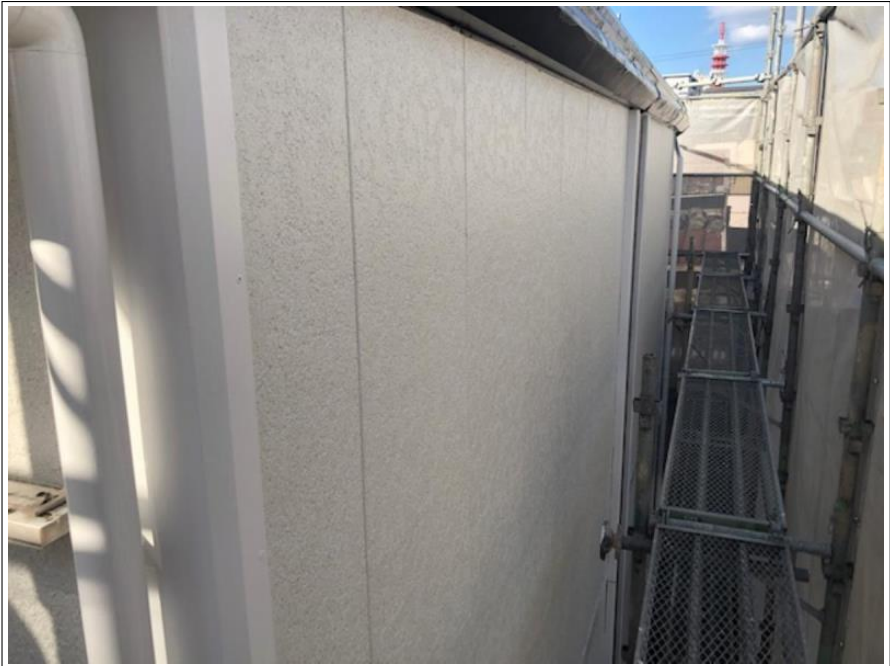

外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了

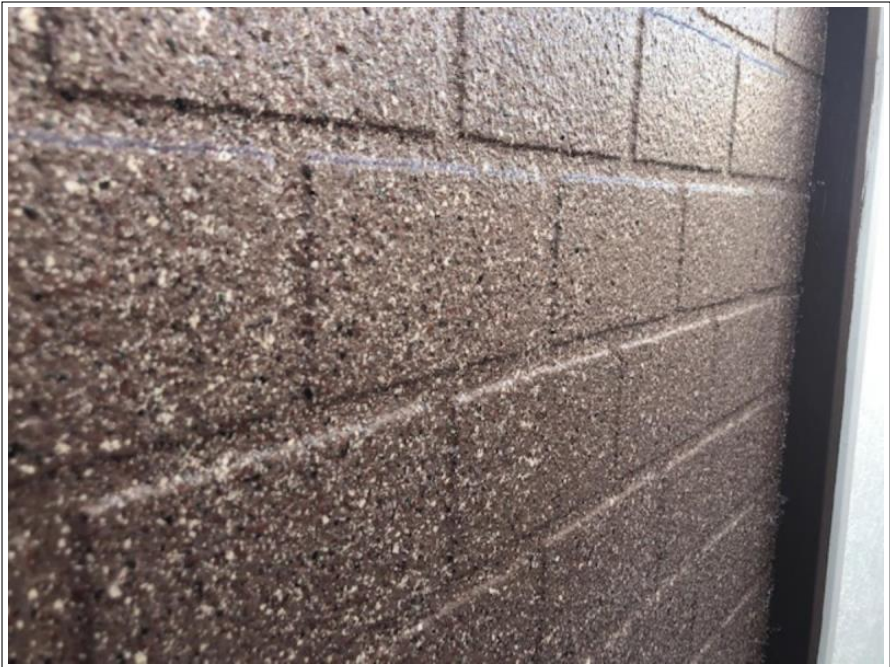

外壁

施工完了

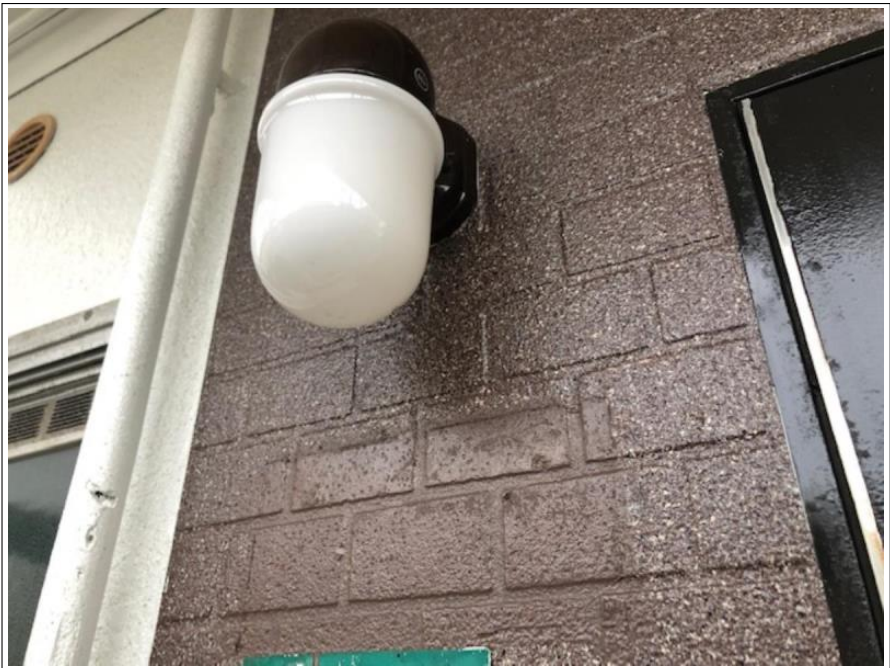

外壁

既存表札撤去後

タッチアップ



外壁

既存表札撤去後

タッチアップ



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
パラペット 着工前	

パラペット

施工前



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
パラペット ケレン	

パラペット

下地処理

ケレン中



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/02
パラペット ケレン	

パラペット

下地処理

ケレン中



パラペット

錆止め塗布



パラペット

錆止め塗布

施工中



パラペット

錆止め塗布

施工中



パラペット

上塗り 1 回目



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



パラペット

上塗り 1 回目

施工中



工 事 名	
日 付	2020/10/08
パラペット	
上塗り2回目	

パラペット

上塗り 2 回目



工 事 名	
日 付	2020/10/08
パラペット 上塗り2回目	

パラペット

上塗り 2回目

施工中



パラペット

上塗り 2回目

施工中



パラペット

上塗り 2回目

施工中




パラペット

施工完了



パラペット

施工完了

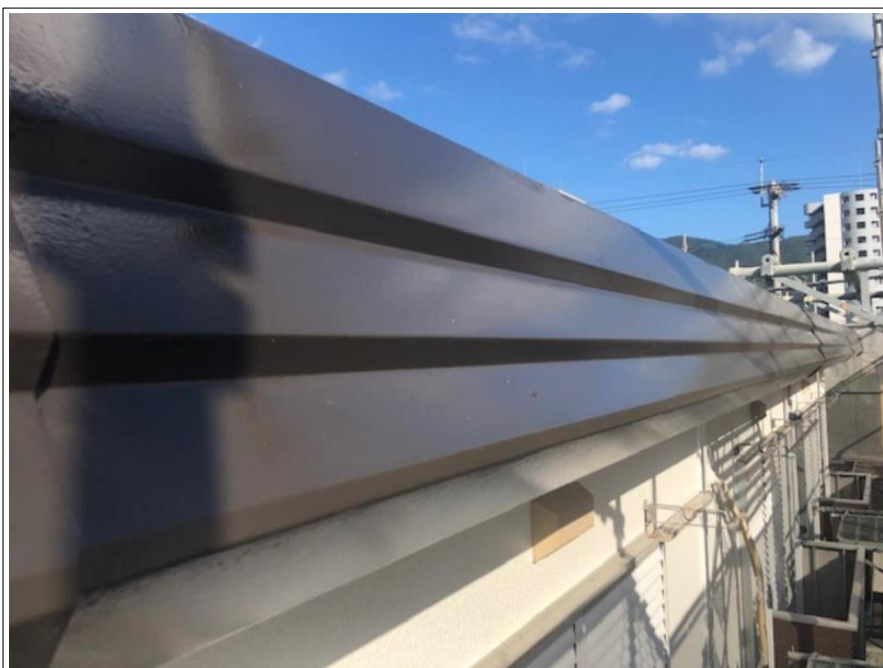


パラペット

施工完了



パラペット

施工完了

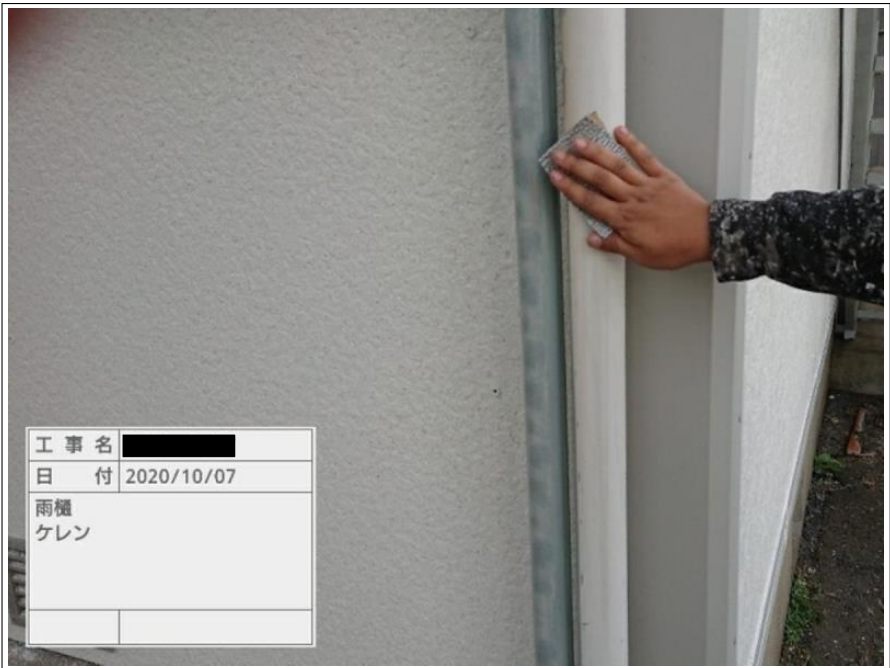

雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋


上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了

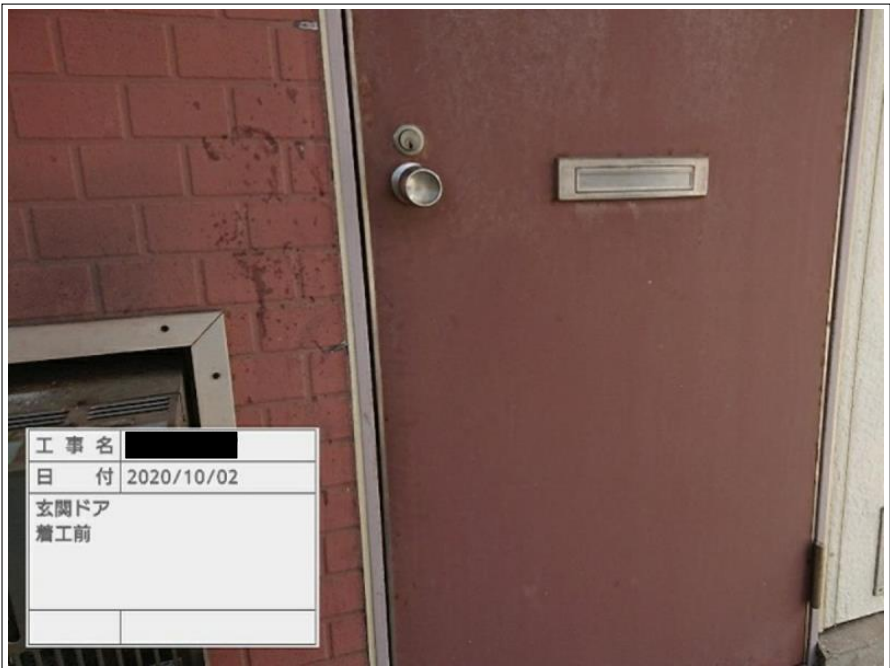

玄関ドア


施工前



玄関ドア

下地処理

ケレン中

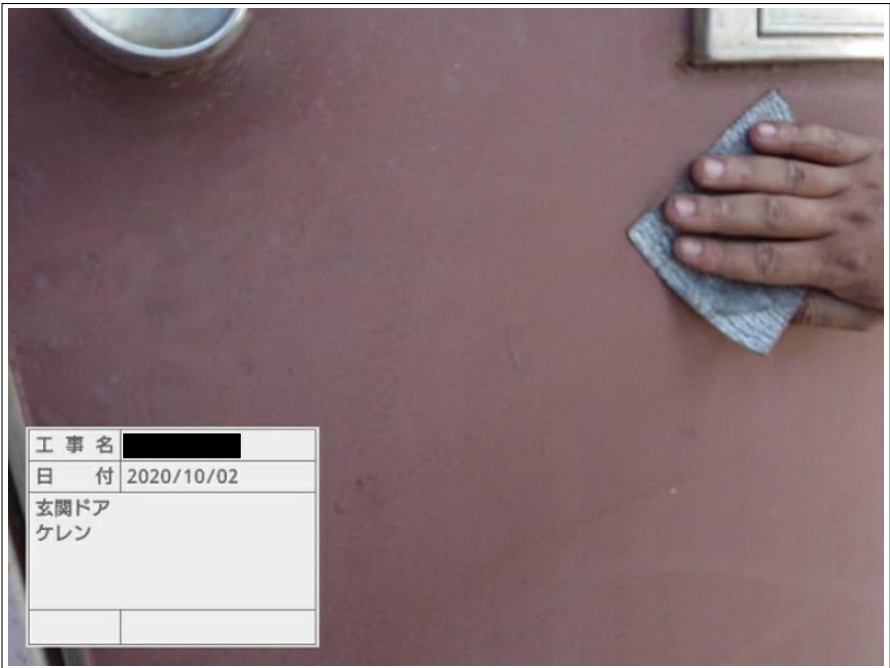

玄関ドア

下地処理

ケレン中



玄関ドア


錆止め塗布



玄関ドア

錆止め塗布


施工中

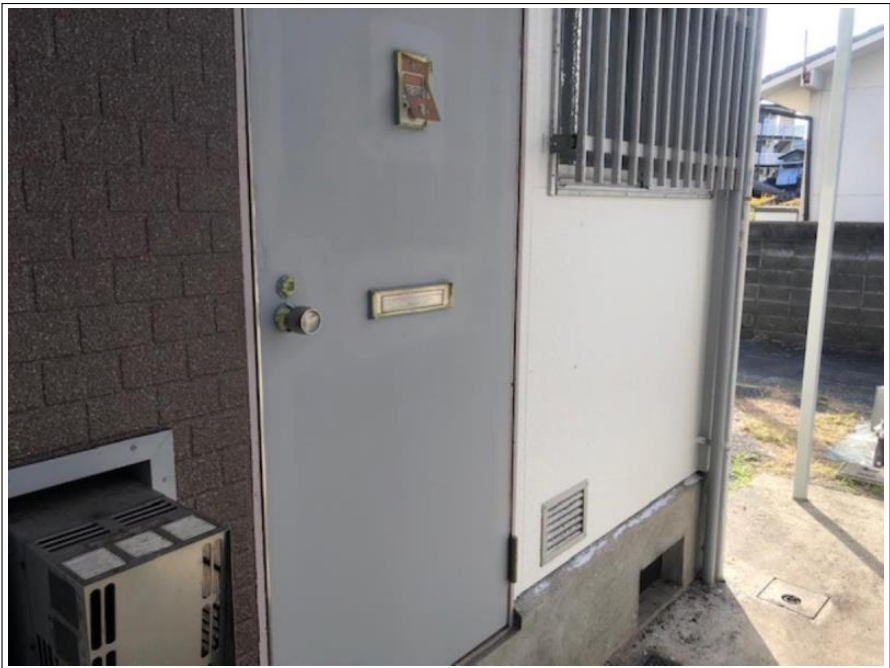

玄関ドア

錆止め塗布

完了

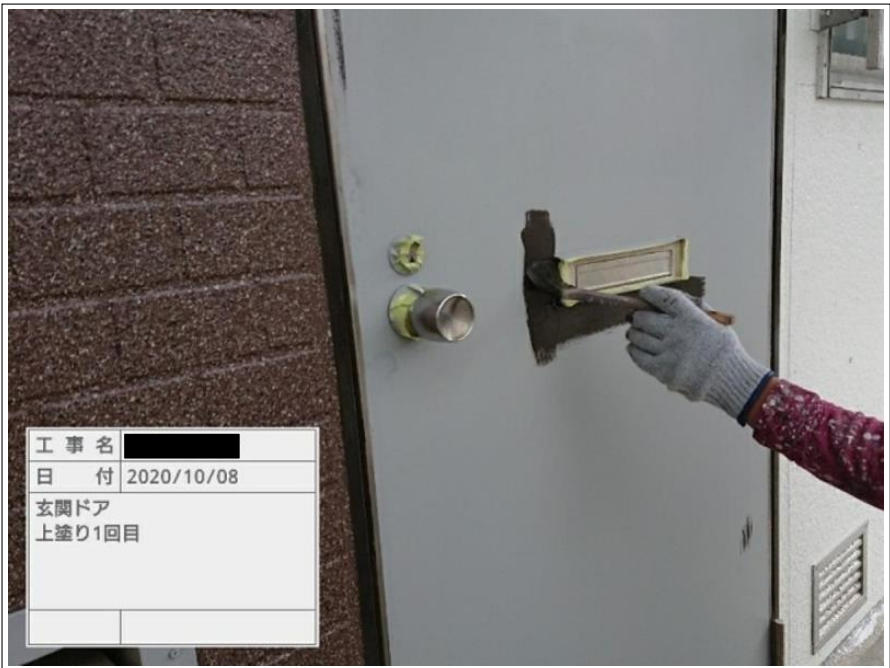

玄関ドア

上塗り 1 回目



玄関ドア

上塗り 1 回目


施工中



玄関ドア


上塗り 1 回目

施工中

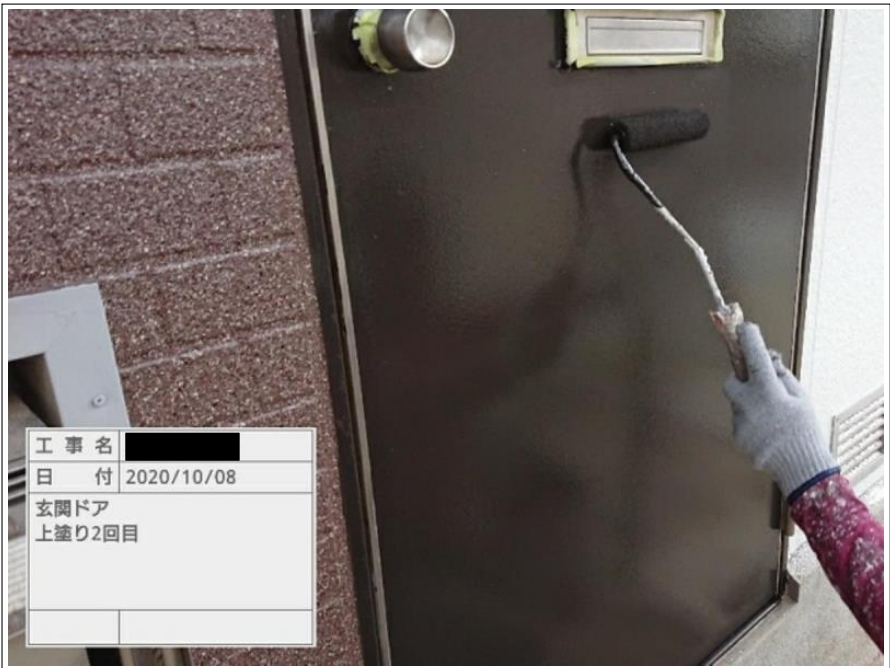

玄関ドア

上塗り 2 回目

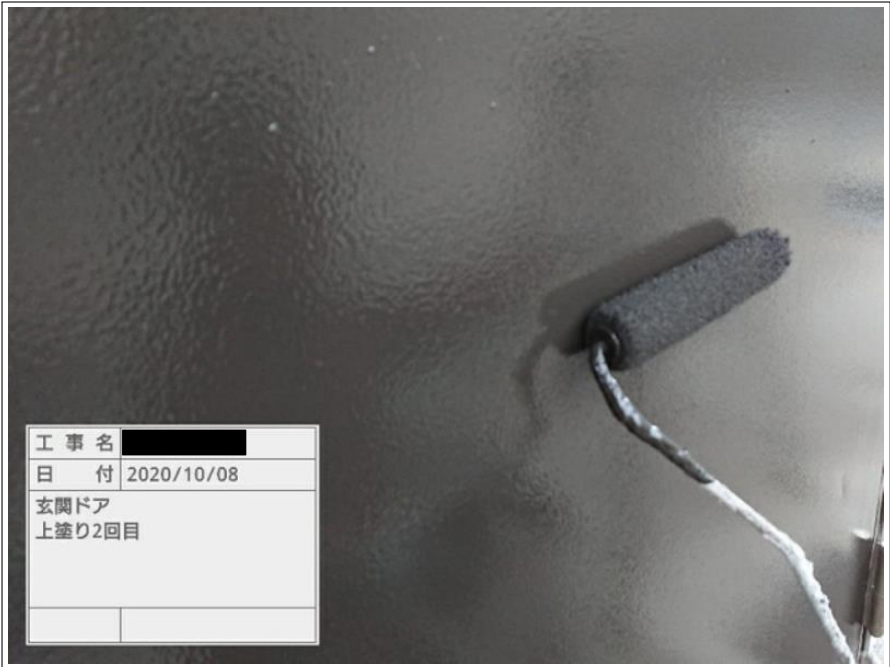

玄関ドア


上塗り 2回目

施工中



玄関ドア

施工完了

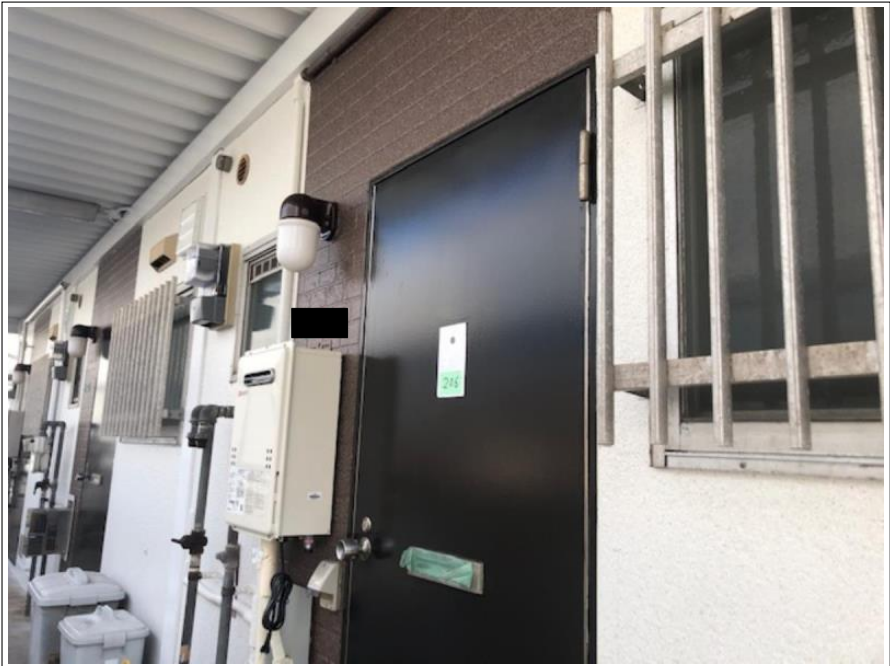


玄関ドア

施工完了



換気口

施工完了

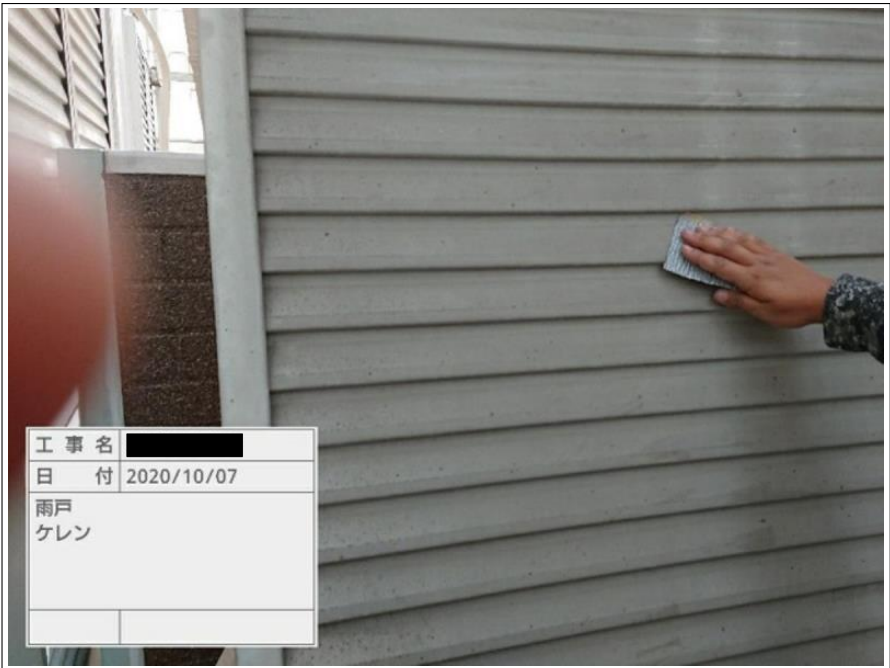

雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/07
雨戸 錆止め	

雨戸

錆止め塗布



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/07
雨戸 錆止め	

雨戸

錆止め塗布


施工中



工 事 名	■■■■■
日 付	2020/10/07
雨戸 上塗り1回目	

雨戸

上塗り 1 回目

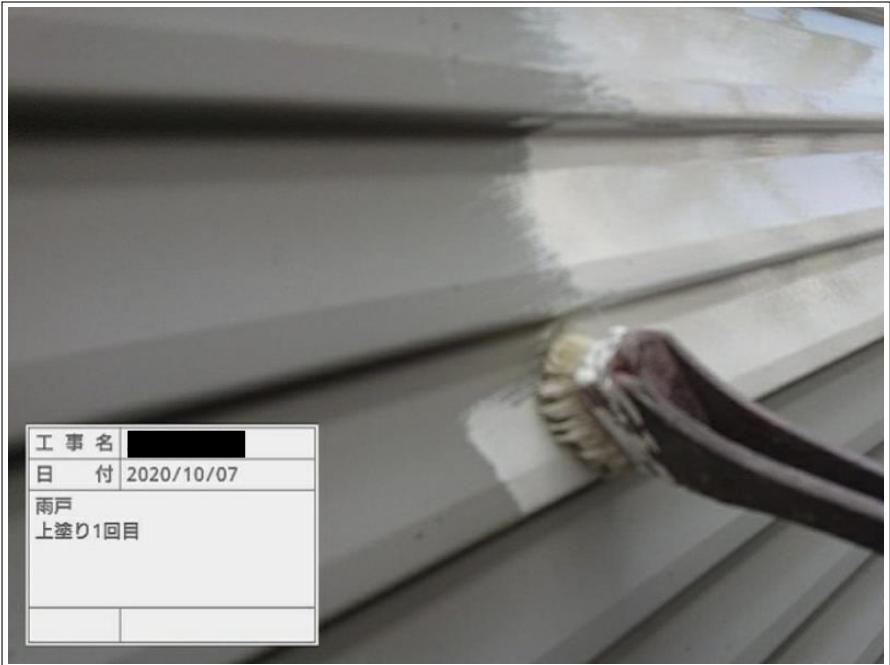

工 事 名	雨戸
日 付	2020/10/07
雨戸	上塗り1回目

雨戸

上塗り 1 回目

施工中



工 事 名	雨戸
日 付	2020/10/08
雨戸	上塗り2回目

雨戸

上塗り 2 回目




工 事 名	雨戸
日 付	2020/10/08
雨戸	上塗り2回目

雨戸


上塗り 2 回目

施工中

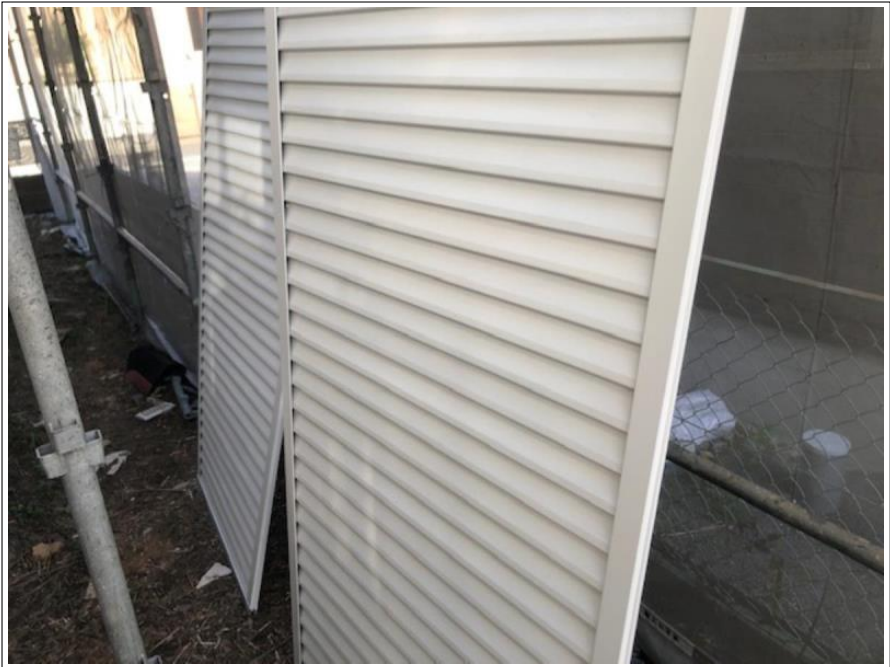

雨戸

施工完了

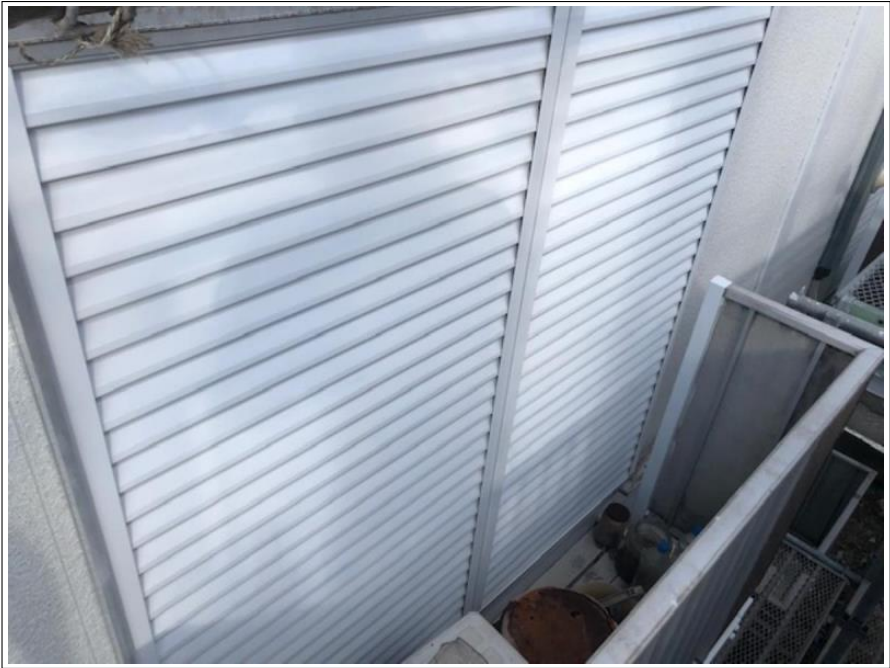

雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



ベランダ 鉄部


上塗り



ベランダ 鉄部

上塗り

施工中

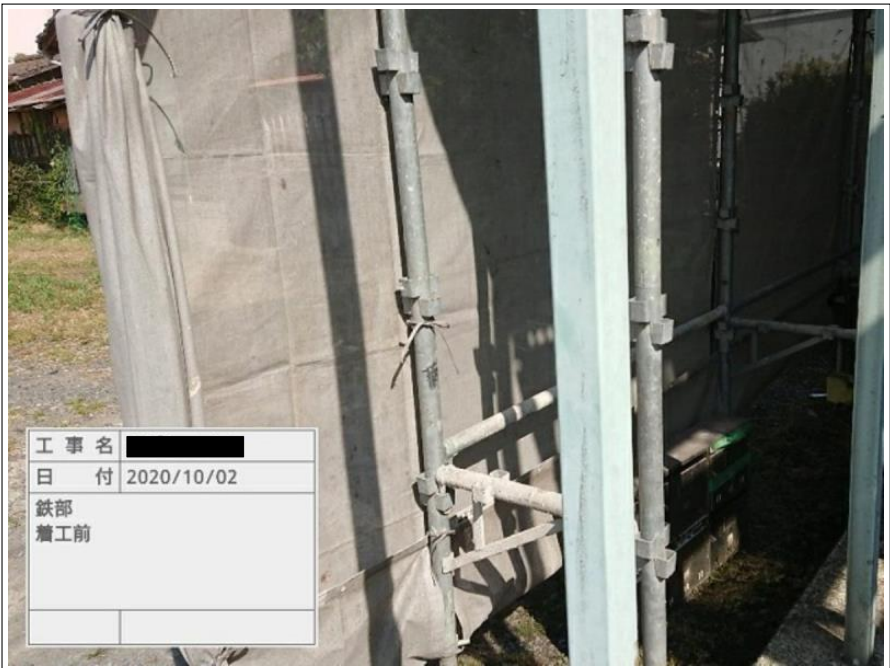

鉄骨柱

施工前



鉄骨柱

下地処理

ケレン中



鉄骨柱

下地処理

ケレン中



鉄骨柱

錆止め塗布



鉄骨柱

錆止め塗布

施工中



鉄骨柱

上塗り 1 回目



鉄骨柱

上塗り 1 回目

施工中



鉄骨柱

上塗り 2回目



鉄骨柱

上塗り 2回目

施工中




鉄骨柱

施工完了



鉄骨階段

施工完了

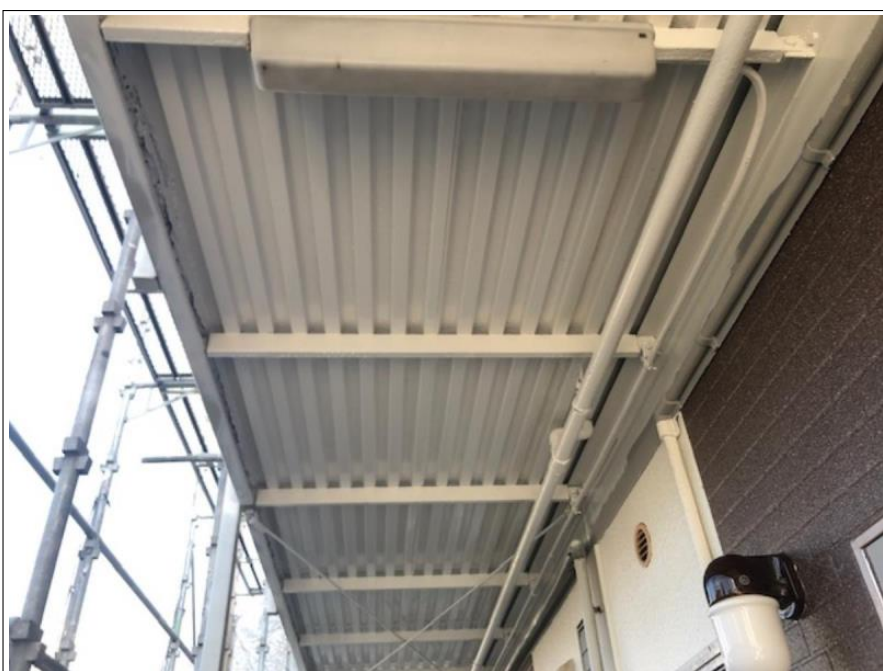


鉄骨階段 上裏

施工完了



鉄骨階段 上裏

施工完了

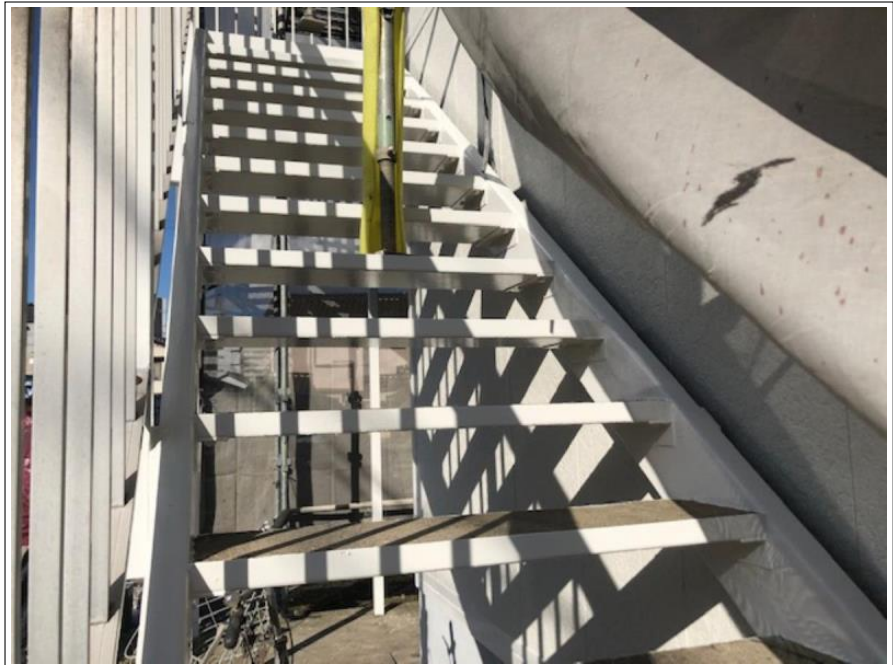

鉄骨階段

施工完了



基礎 クラック部

プライマー塗布



基礎 クラック部

プライマー塗布

施工中



基礎 クラック部

シーリング打ち



基礎 クラック部

シーリング打ち

施工中



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ

施工中



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



清掃



清掃



検査

手直し中



検査

手直し中



折板屋根 下塗材（錆止め材）

サーモテックメタルプライマー

色：グレー



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事名	
日付	2020/10/05
材料搬入	グラナートミドルコート
7000	マーブル

壁メイン部 中塗材

グラナートミドルコート

色：マーブル



工事名	
日付	2020/10/05
材料搬入	グラナートミドルコート
7003	ホルンフェルス

壁アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ホルンフェルス



工事名	
日付	2020/10/06
マーブル	
7000	

壁メイン部 上塗材

グラナートSP

色：マーブル



工事名	■■■■■
日付	2020/10/06
ホルンフェルス	
7003	

壁アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：ホルンフェルス



工事名	■■■■■
日付	2020/10/05
マルチエースII-JY	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事名	■■■■■
日付	2020/10/02
鉄部錆止め	
エポパワーメタル	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



工事名	
日付	2020/10/07
マックスシールド1500Si 19-20B	

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : 19-20 B



工事名	
日付	2020/10/05
マックスシールド N-90	

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-90



工事名	
日付	2020/10/08
ベースガード KG-01	

基礎 塗材

ベースガード



工事名	■■■■■
日付	2020/10/02
シーリング材 プライマー	

シーリング材



工事名	■■■■■
日付	2020/10/03
使用済み材料	

折板屋根 下塗材（錆止め材）

サーモテックメタルプライマー

色：グレー

空缶写真



工事名	■■■■■
日付	2020/10/03
使用済み材料	

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 上塗材

スーパーシャネツサーモ S i

色：クレタグレー

空缶写真




壁メイン部 中塗材

グラナートミドルコート

色：マーブル

空缶写真

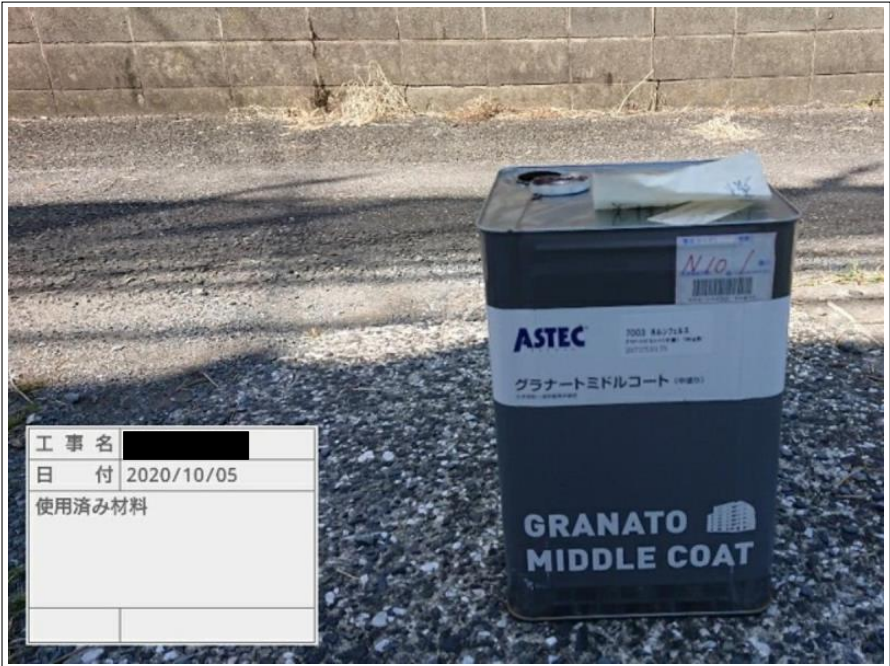

壁アクセント部 中塗材

グラナートミドルコート

色：ホルンフェルス

空缶写真




壁メイン部 上塗材

グラナートSP

色：マーブル

空缶写真

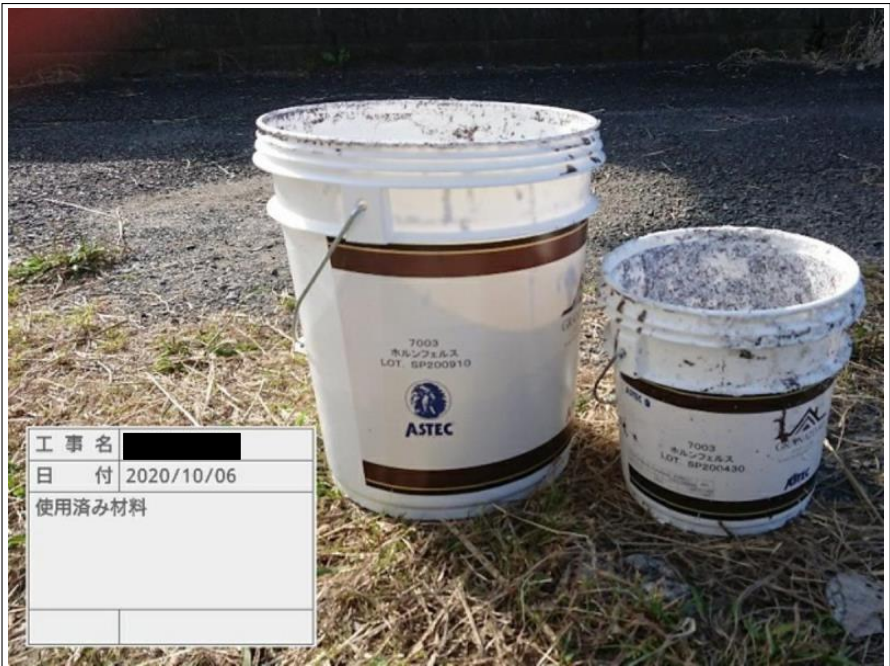

壁アクセント部 上塗材

グラナートSP

色：ホルンフェルス

空缶写真



軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

空缶写真



工事名	
日付	2020/10/05
使用済み材料	



工事名	
日付	2020/10/14
使用済み材料	



工事名	
日付	2020/10/08
使用済み材料	

鉄部 塗材

エポパワーメタル J Y

色：グレー

空缶写真

付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色：N-90

空缶写真

基礎 塗材

ベースガード

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
